



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
2019 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2020

## İÇİNDEKİLER TABLOSU

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Yönetici Özeti .....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Genel Değerlendirme .....</b>                                                       | <b>4</b>  |
| 2.1 Kuruluşun Vizyonu: .....                                                              | 4         |
| 2.2 Kuruluşun Misyonu .....                                                               | 4         |
| 2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:.....                                               | 4         |
| <b>3.Kuruluşun Finansman Kaynakları.....</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>4. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi .....</b>                                        | <b>7</b>  |
| <b>5. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları.....</b>                                             | <b>8</b>  |
| <b>6. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI .....</b>                                              | <b>10</b> |
| 6.1 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI .....                                                    | 11        |
| 6.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELER ETÜT PROJE .....                                                   | 11        |
| 6.1.2 KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI İŞİ.....                                                     | 11        |
| 6.1.3 KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ .....                              | 12        |
| 6.1.4 DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK BİNA YAPIM İŞİ .....                                     | 15        |
| 6.1.5 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ EK ATÖLYE BİNASI İNŞ. İŞİ .....                         | 16        |
| 6.1.6 ERÜ. TIP FAKÜLTESİ MERKEZİ DERSLİKLER BİNASI YAPIM İŞİ .....                        | 17        |
| 6.1.7 ÖĞRENCİ YEMEKHANELERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ .....                                     | 18        |
| 6.1.8. ERÜ REKTÖRLÜK BİNASI ONARIM VE TADİLAT İNŞAATI .....                               | 18        |
| 6.1.9 EĞİTİM BÜYÜK ONARIM İNŞAATI İŞLERİ.....                                             | 20        |
| 6.1.10 ERÜ. TALAS KONUKEVİ 1 NOLU BİNA İKMAL RESTORASYON UYGULAMA İŞİ .....               | 24        |
| 6.1.11 HASTANELER OG ELEKTRİK TESİSATI YENİLEME VE ONARIM İŞİ .....                       | 25        |
| 6.1.12 ORGAN NAKLİ HASTANESİ ONARIM VE KALP HASTANESİ YANGIN MERDİVENİ<br>YAPIM İŞİ ..... | 26        |
| 6.1.13 SAĞLIK MAKİNE TECHİZAT ALIMLARI .....                                              | 28        |
| 6.1.14 EĞİTİM MAKİNE TECHİZAT VE BİLGİSAYAR ALIMI .....                                   | 30        |
| 6.1.15 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ .....                                                 | 30        |
| 6.1.16 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ AŞISI .....                                              | 31        |
| 6.1.17 YAYIN ALIMI VE BİLGİ ABONELİK GİDERLERİ .....                                      | 31        |
| 6.1.18 YAZILIM ALIMI .....                                                                | 32        |

# 1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Orta Vadeli Mali Planda da belirtildiği gibi, etkin bir kamu mali yönetimi, giderlerin iyi bir şekilde önceliklendirilmesi ve kaynakların bu önceliklere göre tahsisi esas alınmıştır. Üniversitemiz 2019 mali yılında da öncelikle yıllardır inşaatı devam eden projelerin sonuçlandırılmasını hedeflemiştir. 2019 yılı yatırımları için ayrılan bütçe kaynaklarının, 5018 sayılı Kanunun öngördüğü çerçevede bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak etkin, ekonomik ve verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Üniversitemiz Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen projeler için ayrılan ve öz gelirlerimizden ayrılan bütçe kaynaklarının etkin, verimli ve öngörülen plan çerçevesinde kullanılmasına çalışılmıştır.

Bu projeler kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri uygun programlarda çalıştırılarak, hem akademik eğitimlerini alırlarken aynı zamanda AR-GE kapsamında araştırma için yapılması gereken deneysel veya hesaplamalı değişik çalışmalarda bulunmaları sağlanmıştır. Bu şekilde Üniversitemizin gerek araştırmacı gücünün ve gerekse yayın kapasitesinin desteklenmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin doğrudan endüstriyel uygulamaların içinde yer almaları sağlanarak genç girişimci ve araştırmacı kadroların yetişmesine ve ülkemiz için gerekli olan yetişmiş uzman açığının kapatılmasına büyük destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin yaygınlaştırılabilmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin devam ve daha iyiye götürülmesi için mali olanaklar hayati önem taşımaktadır. Mali olanaklarımızın artırılması doğrudan sunulan hizmetlerimizi etkilemiş olacaktır. Bu nedenle, Üniversitemize ait öz gelirlerin çeşitlendirilmesi ve elde edilen gelirin artırılması için projeler ve planlamalar yapılmaktadır.

**Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ**

**Rektör**

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1 KURULUŞUN VİZYONU:

Erciyes Üniversitesi; eğitim ve öğretimde çağdaş, bilgi ve teknoloji üreten, ürettiği bilgi ve teknolojiyi daima toplum yararına kullanan, çevreye ve insanlığın temel değerlerine duyarlı ve faaliyet alanlarında öncü olmayı benimsemiş bir üniversitedir.

### 2.2 KURULUŞUN MİSYONU

Yetiştirdiği öğrencileri; bilim odaklı düşünen, sorgulayan, araştıran, ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak evrensel düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler olan, mensubu olmaktan onur duyulan, eğitim, araştırma ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak, ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almak.

### 2.3 KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

#### A. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK

- A1.** Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna kadar %20 artırılması
- A2.** Öğretim elemanı niteliğinin artırılması ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2021 yılı sonuna kadar %10 azaltılması
- A3.** Öğrenci niteliğinin artırılması ve 2021 yılı sonuna kadar öğrenci geri bildirim oranının %20 artırılması
- A4.** 2021 yılı sonuna kadar uzaktan eğitimin kapsamının %100 artırılması ve 2018 yılına kadar Açık Öğretim Fakültesinin kurulması

#### B. KURUMSAL KAPASİTEYİ VE KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK

- B1.** 2021 yılı sonuna kadar eğitim ve çalışma ortamlarının tamamının iyileştirilmesi
- B2.** 2021 yılı sonuna kadar mensupların sosyal ihtiyaçlarını kampüs içinde karşılayabilen ortamların oluşturulması ve geliştirilmesi
- B3.** 2021 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin nitelik ve niceliksel gelişiminin sağlanması
- B4.** 2021 yılına kadar kurumsal kültürün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve ERÜ aidiyet hissinin artırılması
- B5.** 2017 yılı sonuna kadar mezunlarla iletişim ofisinin kurulması ve 2021 yılı sonuna kadar mezunların %80'inin veri tabanında kayıt altına alınması

**C. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEDE DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALMAK**

**C1.** Nitelikli araştırmacı sayısının 2021 yılı sonuna kadar %50 artırılması

**C2.** Yüksek etki değerlerine sahip yayın ve araştırmaların sayısını 2021 yılı sonuna kadar %50 artırmak

**C3.** Araştırma merkezlerinin etkinliğinin 2021 yılı sonuna kadar %100 artırılması

**Ç. TOPLUMSAL HİZMET FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK**

**Ç1.** Toplumsal hizmetlerde memnuniyet düzeyinin 2021 sonuna kadar her yıl düzenli %5 artırılması

**Ç2.** Sağlık hizmeti sunum alanlarında alt yapıya ve donanımına yönelik fiziksel iyileştirmelerin 2021 yılına kadar yapılması

**Ç3.** Sağlık turizmi hasta sayısının düzenli olarak artışının sağlanarak 2021 yılında 200 hasta sayısına ulaşılması

**Ç4.** Alakart restoran hizmetlerinin 2019 yılı sonuna kadar faaliyete geçirilmesi

**Ç5.** ERSEM'in meslek alanında 2020 yılına kadar akredite ulusal mesleki yeterlilik belgesi verebilir hale getirilmesi

**D. ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM-ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI YERLEŞTİRMEK VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK**

**D1.** 2019 yılına kadar “Çevreye Duyarlı Yönetim Modeli” oluşturulması

**D2.** 2021 yılına kadar çalışanlarda, öğrencilerde ve toplumda çevre bilinci farkındalığının oluşturulması

**D3.** Yerleşkenin fiziki gelişim planının, 2021 yılına kadar, çevreye duyarlılık çerçevesinde uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

**D4.** 2021 yılına kadar, dezavantajlı gruplara duyarlı bilinç oluşturulması, geliştirilmesi ve alt yapı çalışmalarının 2019 yılına kadar tamamlanması

### 3.KURULUŞUN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2019 yılına ait Bütçe Kanunu ile belirlenen gelirlerimiz (Tablo.1) ve giderlerimiz (Tablo.2) aşağıdaki gibidir.

| GELİRLER            |   |   |                                                    | 2019               |
|---------------------|---|---|----------------------------------------------------|--------------------|
|                     |   |   |                                                    | KBÖ                |
| 3                   |   |   | <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>              | <b>23,376,000</b>  |
|                     | 1 |   | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                      | 22,592,000         |
|                     | 6 |   | Kira Gelirleri                                     | 784                |
| 4                   |   |   | <b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b> | <b>492,808,000</b> |
|                     |   | 1 | Cari                                               | 444,368,000        |
|                     |   | 2 | Sermaye                                            | 48,440,000         |
| 5                   |   |   | <b>Diğer Gelirler</b>                              | <b>16,579,000</b>  |
|                     | 1 |   | Faiz Gelirleri                                     | 3,001,000          |
|                     | 2 |   | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                  | 2,326,000          |
|                     | 3 |   | Para Cezaları                                      | 3                  |
|                     | 9 |   | Diğer Çeşitli Gelirler                             | 11,249,000         |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |   |   |                                                    | <b>532,763,000</b> |

(Tablo.1)

| GİDERLER |                                                 | 2019        |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                 | KBÖ         |
| 1        | PERSONEL GİDERLERİ                              | 372,257,000 |
| 2        | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 57,322,000  |
| 3        | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                    | 34,673,000  |
| 5        | CARİ TRANSFERLER                                | 17,704,000  |
| 6        | SERMAYE GİDERLERİ                               | 50,807,000  |
|          | GENEL TOPLAM                                    | 532,763,000 |

(Tablo.2)

## 4. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1978 Yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulan üniversitemizin ilk fakülteleri 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında açılan Kayseri İşletme Fakültesi'dir. 1982 yılında Kayseri'de bulunan diğer iki yükseköğretim kurumu da Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi adıyla üniversitemize bağlanmıştır. Ardından Üniversitenin adı Erciyes Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür.

Üniversitemiz, toplam 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 39 araştırma ve uygulama merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hizmet vermektedir. Türkiye'de Diş Hekimliği üzerine tek dal olan 15 yataklı Ağız Diş ve Çene Cerrahi Hastanesi üniversitemizde bulunmaktadır. Merkez kampüsümüzde bulunan fakültelerimiz; Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği, İletişim, Eğitim, Hukuk, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Mimarlık, Fen, Edebiyat, Veterinerlik, Turizm, Havacılık ve Uzun Bilimleri ve Seyrani Ziraat Fakültesidir.

Yüksekokulumuz 4 yıllık olup, bu; Yabancı Diller Yüksekokuludur. Yüksekokulumuz 15 Temmuz kampüsümüzde bulunmaktadır.

Meslek yüksekokullarımız 2'şer yıllık olup, bunlar; Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokuludur.

Erciyes Üniversitesi'nin toplam 4.943.496,00 m<sup>2</sup> arazisi bulunmaktadır. Toplam kampüs kapalı alanı 695.669 m<sup>2</sup> dir.

Üniversitemiz Merkez Kampüs ve 15Temmuz Kampüsünden oluşmaktadır.

**Haziran Ayı İtibariyle Öğrenci Sayısı**

| Öğrenci Sayısı | Örgün        | II. Öğretim  | Yabancı Öğrenci | Uzaktan Öğretim | Toplam       |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Ön Lisans      | 1711         |              |                 |                 |              |
| Lisans         | 24822        | 11714        | 1263            |                 |              |
| Yüksek Lisans  | 6371         |              | 387             |                 |              |
| Doktora        | 1535         |              | 121             |                 |              |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>34439</b> | <b>11714</b> | <b>387</b>      |                 | <b>46158</b> |


An itibariyle toplam 46158 öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir. Sonuç olarak 46.000'e yaklaşık öğrencisi, 4.943.496,00 m<sup>2</sup> arazisi, 695.669m<sup>2</sup> kapalı alanı 2.209 akademik (46 kişi yabancı uyruklu) ve 2874 kadrolu idari personeli 1941 sürekli işçiye sahip personeli ile eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir.

**5. 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI**


2019 yılı yatırım programıyla Üniversitemize verilen yatırım bütçesi (döner sermaye kaynakları dahil) 34.500.-TL olup bu yatırım bütçesi Merkezi Yönetimce ve Kurumumuz öz gelirleriyle yapılan eklemelerle birlikte 40.899.-TL'ye ulaşmıştır. Toplam yatırım bütçesinin 38.476.-TL'si kullanılmıştır. Buna göre yatırım harcamasının yatırım bütçesine oranı %94.94'tür.

| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA                        | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ    | YILSONU ÖDENEK TOPLAMI | HARCAMA              | HARCA MA ORANI |
|--------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 6.1          | MAMUL MAL ALIMLARI              | 19,657,000.00        | 56,200,076.00          | 33,445,674.00        | 59.51%         |
| 6.3          | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI        | 1,000,000.00         | 1,377,000.00           | 1,122,791.00         | 81.54%         |
| 6.5          | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD. | 16,800,000.00        | 33,582,000.00          | 33,206,435.00        | 98.88%         |
| 6.7          | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD    | 13,350,000.00        | 14,688,000.00          | 10,591,209.00        | 72.11%         |
|              | <b>TOPLAM</b>                   | <b>50,807,000.00</b> | <b>105,847,076.00</b>  | <b>78,366,109.00</b> | <b>0.74</b>    |

## 2019 Yılı Yatırımların Tertip Bazında Gösterimi

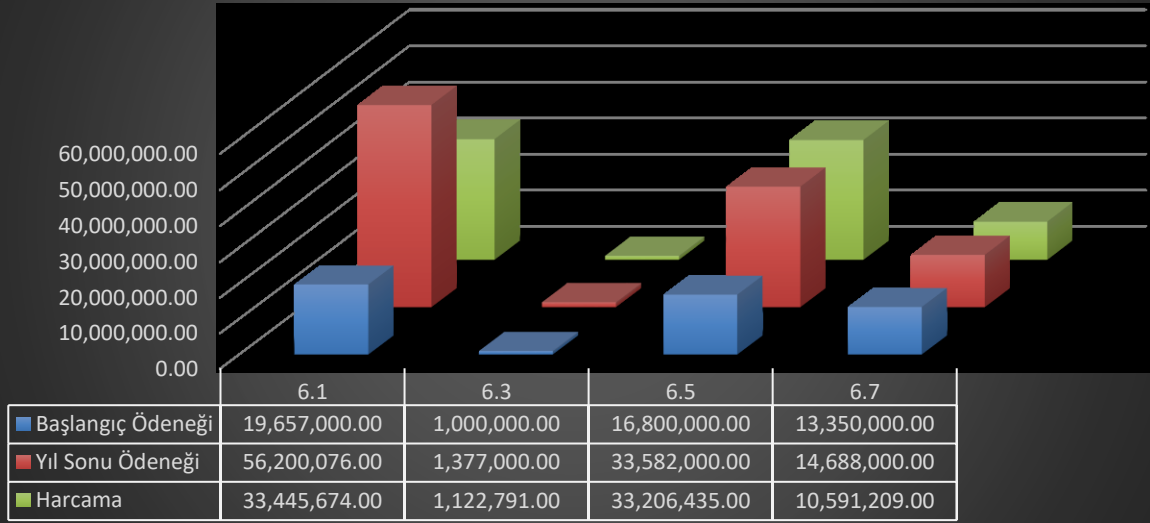

## 2019 Yılı Sermaye Ödeneği Dağılımı

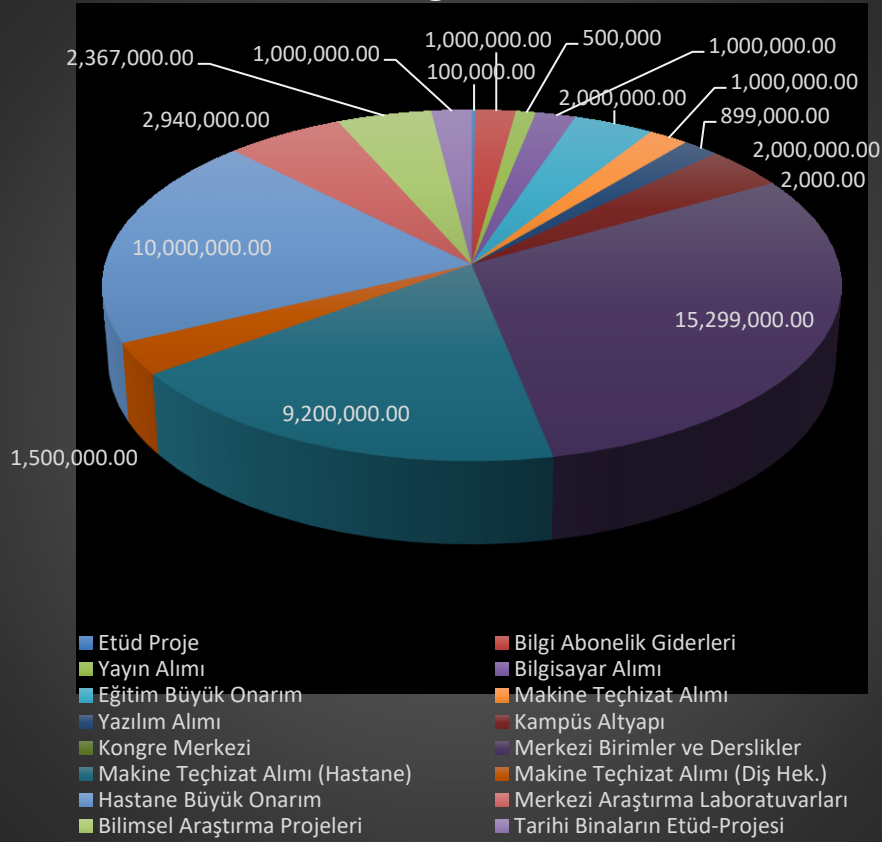

## 6. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

Aşağıdaki tabloda proje bazında 2019 yılı toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleştirme oranları verilmiştir. 2019 yılsonu itibarıyla toplam ödeneğe göre gerçekleştirme oranı % 77 olduğu görülmektedir.

| 2019 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Gerçekleşme Durumunu Gösteren Cetvel |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Projenin Adı                                                                           | Yılı Toplam Ödenek | 2019 Yılı Harcama | Gerçekleşme Oranı |
| <b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>                                                                  | <b>48.832.000</b>  | <b>48.052.086</b> | <b>98%</b>        |
| Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri                                                      | 100.000            | 100.000           | 100%              |
| Kampüs Altyapısı                                                                       | 2.240.000          | 2.679.595         | 120%              |
| Kongre Merkezi                                                                         | 16.544.000         | 17.485.887        | 106%              |
| Derslik ve Merkezi Birimler                                                            | 14.698.000         | 12.934.630        | 88%               |
| Muhtelif İşler                                                                         | 11.850.000         | 11.644.533        | 98%               |
| Kütüphane Bilgi Abonelik ve Yayın Alımı                                                | 3.400.000          | 3.207.441         | 94%               |
| <b>SAĞLIK SEKTÖRÜ</b>                                                                  | <b>20.700.000</b>  | <b>12.937.225</b> | <b>62%</b>        |
| Makine-Teçhizat Alımı                                                                  | 15.350.000         | 11.683.553        | 76%               |
| Büyük Onarım                                                                           | 5.350.000          | 1.253.672         | 23%               |
| <b>TEKNOLOJİK VE ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ</b>                                                 | <b>33.063.076</b>  | <b>18.109.303</b> | <b>55%</b>        |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri                                                 | 30.123.076         | 15.169.303        | 50%               |
| Kırım Kongo Kanamalı Ateş Aşısı                                                        | 2.940.000          | 2.940.000         | 100%              |
| <b>KÜLTÜR SEKTÖRÜ</b>                                                                  | <b>1.000.000</b>   | <b>800.000</b>    | <b>80%</b>        |
| Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu                                                  | 1.000.000          | 800.000           | 80%               |
| <b>YATIRIM HARCAMA TOPLAMI</b>                                                         | <b>103.595.076</b> | <b>79.898.614</b> | <b>77%</b>        |

## 6.1 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 6.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELER ETÜT PROJE

| <b>ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ</b> |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Sektör</b>                          | Eğitim                          |
| <b>Proje No</b>                        | 2019H03089-3316                 |
| <b>Proje Adı</b>                       | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi |
| <b>Proje Yeri</b>                      | Kayseri                         |
| <b>Karakteristik</b>                   | Etüt-Proje                      |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>              | 2019-2019                       |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>            |                                 |

Üniversitemiz yatırım programına ilişkin proje ihtiyaçları karşılanmıştır.

### 6.1.2 KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI İŞİ

| <b>KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI</b> |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Sektör</b>                 | Eğitim          |
| <b>Proje No</b>               | 2018H03-42829   |
| <b>Proje Adı</b>              | Kampüs Altyapı  |
| <b>Proje Yeri</b>             | Kayseri         |
| <b>Karakteristik</b>          | Altyapı         |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>     | 2019-2019       |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>   | 1.823.000,00 TL |

2019/152547 ihale kayıt nolu ERÜ. Kampüs Altyapı İnşaatı İşi 20/06/2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, söz konusu işin geçici kabulü 29/11/2019 tarihinde yapılmıştır.

#### ALTYAPI ONARIM



### 6.1.3 KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ

| KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ İKMAL İNŞAATI |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Sektör                                 | Eğitim                          |
| Proje No                               | 1994H03-455                     |
| Proje Adı                              | Kongre Ve Kültür Merkezi        |
| Proje Yeri                             | Kayseri                         |
| Karakteristik                          | Eğitim (29.350 m <sup>2</sup> ) |
| Başlama-Bitiş Yılı                     | 2016-2019                       |
| Sözleşme Bedeli (TL)                   | 41.410.000,00 TL                |

Kongre Ve Kltr Merkezi İkmal İnřaatı Projesinin İhalesi 2016 yılında yapılmıř olup 2019 yılı sonu itibariyle bina tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiřtir.

### KONGRE VE KLTR MERKEZİ





**6.1.4 DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK BİNA YAPIM İŞİ**

| <b>DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK BİNA İNŞAATI</b> |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                                  | Eğitim                             |
| <b>Proje No</b>                                | 2006H03-813                        |
| <b>Proje Adı</b>                               | Diş Hekimliği Eğitim Binası        |
| <b>Proje Yeri</b>                              | Kayseri                            |
| <b>Karakteristik</b>                           | Eğitim (19.018 m <sup>2</sup> )    |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                      | 2018 -                             |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>                    | 34.866.000,00 TL (Tasfiye edildi.) |


Diş Hekimliği Fakültesi Ek Bina işinin İhalesi 2018 yılında yapılmış olup, A Ve C Blokların temelleri atılmış, B Blok'un Betonarme İmalatları tamamlanmış olup,05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4. Maddesine istinaden yüklenicinin fesih talebi Hazine Ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü neticesinde 08.08.2019 tarihinde feshedilip iş tasfiye edilmiştir

**DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EK BİNA**

**6.1.5 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ EK ATÖLYE BİNASI İNŞ. İŞİ**

| <b>HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ EK ATÖLYE BİNASI İNŞ. İŞİ</b> |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                                                | Eğitim                                                |
| <b>Proje No</b>                                              | 2006H03-813                                           |
| <b>Proje Adı</b>                                             | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Ek Atölye Binası İnş. İşi |
| <b>Proje Yeri</b>                                            | Kayseri                                               |
| <b>Karakteristik</b>                                         | Eğitim (3450 m <sup>2</sup> )                         |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                                    | 2018-2019                                             |
| <b>Sözleşme Bedeli(TL)</b>                                   | 2.888.000,00 TL                                       |

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ek Atölye Binası inşaatı yapımına 2018 yılında başlanmış ve 09.08.2019 da tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.

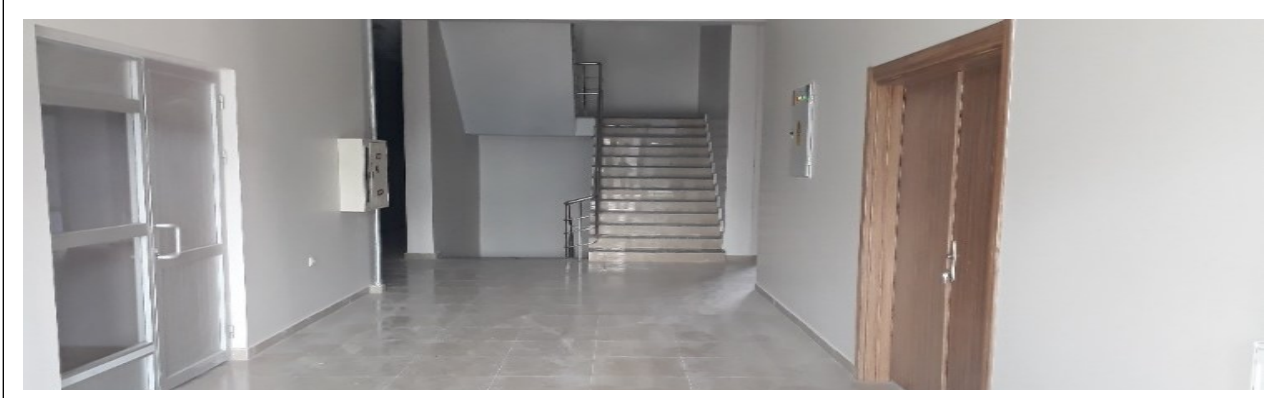
**HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EK ATÖLYE BİNASI**

### 6.1.6 ERÜ. TIP FAKÜLTESİ MERKEZİ DERSLİKLER BİNASI YAPIM İŞİ

| TIP FAKÜLTESİ MERKEZİ DERSLİKLER BİNASI YAPIM İŞİ |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                                     | Eğitim                                                |
| <b>Proje No</b>                                   | 2006H03-813                                           |
| <b>Proje Adı</b>                                  | ERÜ Tip Fakültesi Merkezi Derslikler Binası Yapım İşi |
| <b>Proje Yeri</b>                                 | Kayseri                                               |
| <b>Karakteristik</b>                              | Yapım                                                 |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                         | 2017-2020                                             |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>                       | 17.420.000,00 TL                                      |

08.12.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak inşaatına başlanmış 2019 yılında imalatlara devam edilerek duvar, iç-dış sıva, cephe boya ve kompozitleri, çatı, klima ve jeneratör ekipmanları, elektrik panoları, dış alüminyum doğramalar ve camları ile asma tavan çelik karkasın büyük kısmı tamamlanarak iş %51 seviyelerine getirilmiştir. 2020 yılında kalan imalatların bitirilerek inşaatın teslim edilmesi planlanmaktadır.

#### TIP FAKÜLTESİ MERKEZİ DERSLİKLER BİNASI

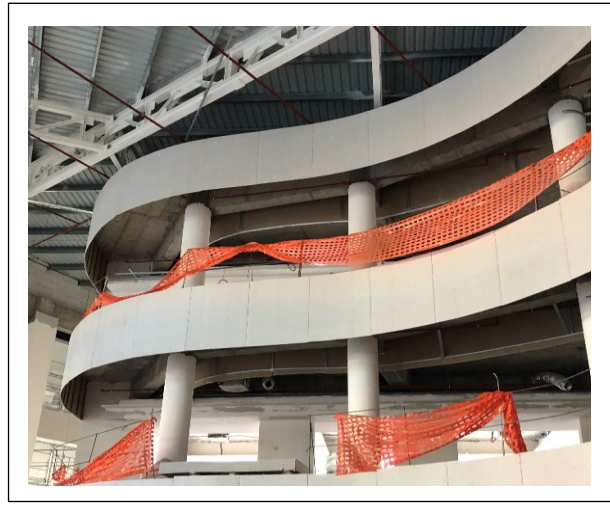


### 6.1.7 ÖĞRENCİ YEMEKHANELERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ

| ÖĞRENCİ YEMEKHANELERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                             | Eğitim                                        |
| <b>Proje No</b>                           | 2006H03-813                                   |
| <b>Proje Adı</b>                          | ERÜ Öğrenci Yemekhaneleri Bakım Ve Onarım İşİ |
| <b>Proje Yeri</b>                         | Kayseri                                       |
| <b>Karakteristik</b>                      | Onarım                                        |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                 | 2019-2019                                     |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>               | 3.580.110,14 TL                               |

ERÜ Öğrenci yemekhaneleri Bakım ve Onarım işinin ihalesi 28.03.2019 tarihinde yapılmış olup onarım çalışmaları 04.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

### ÖĞRENCİ YEMEKHANELERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ

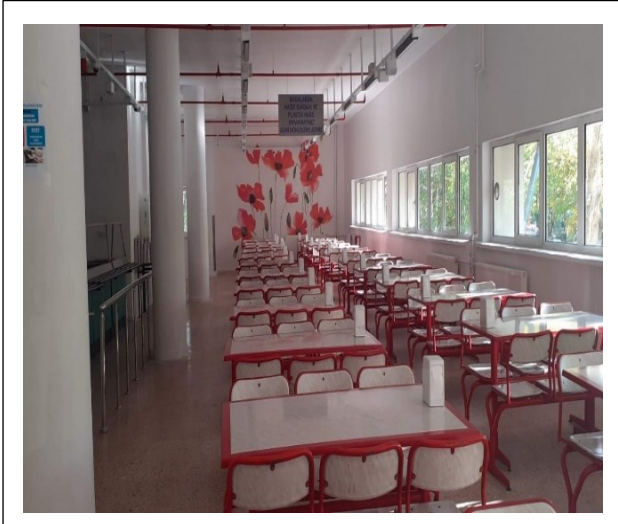


### 6.1.8. ERÜ REKTÖRLÜK BİNASI ONARIM VE TADİLAT İNŞAATI

| REKTÖRLÜK BİNASI ONARIM VE TADİLAT İNŞAATI |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                              | Eğitim                                         |
| <b>Proje No</b>                            | 2019H030590                                    |
| <b>Proje Adı</b>                           | ERÜ Rektörlük Binası Onarım ve Tadilat İnşaatı |
| <b>Proje Yeri</b>                          | Kayseri                                        |
| <b>Karakteristik</b>                       | Onarım- Tadilat                                |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                  | 2019-2019                                      |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>                | 738.729,68 TL                                  |

ERÜ Rektörlük Binası Onarım Ve Tadilat İnşaatı işinin İhalesi 2019 yılında yapılmıştır. 17.09.2019 tarihinde iş yeri teslim edilmiş olup 20.12.2019 tarihinde onarım ve tadilat inşaatı işi bitirilmiştir.

#### REKTÖRLÜK BİNASI ONARIM VE TADİLAT İŞİ

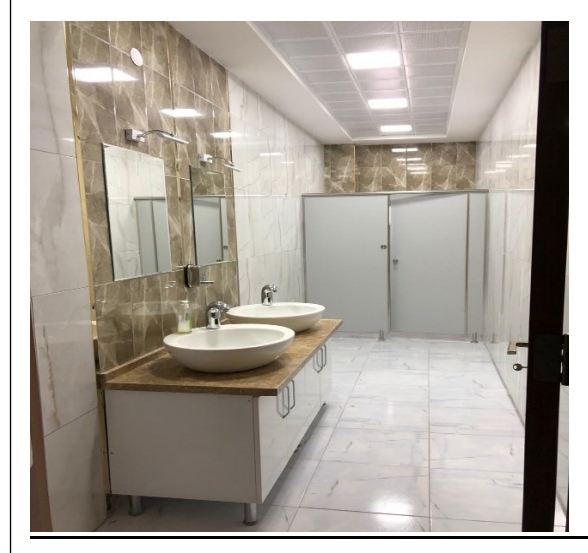

### 6.1.9 EĞİTİM BÜYÜK ONARIM İNŞAATI İŞLERİ

| EĞİTİM BÜYÜK ONARIM  |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Sektör               | Eğitim                             |
| Proje No             | 2019H03-3317                       |
| Proje Adı            | Muhtelif İşler-Eğitim Büyük Onarım |
| Proje Yeri           | Kayseri                            |
| Karakteristik        | Bakım-Onarım                       |
| Başlama-Bitiş Yılı   | 2019-2019                          |
| Sözleşme Bedeli (TL) | 1.015.059,40TL                     |

Üniversitemiz çeşitli birimlerinin 2019 yılı talepleri doğrultusunda ödenek durumuna göre çalışmalar yürütülmüş ve 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanarak kabulü yapılmıştır.


#### YILDIZ KREŞ





### HALİL BAYRAKTAR SAęLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ATI ONARIMI



### HARİTA MÜHENDİSLİęİ BİNASI ONARIMI

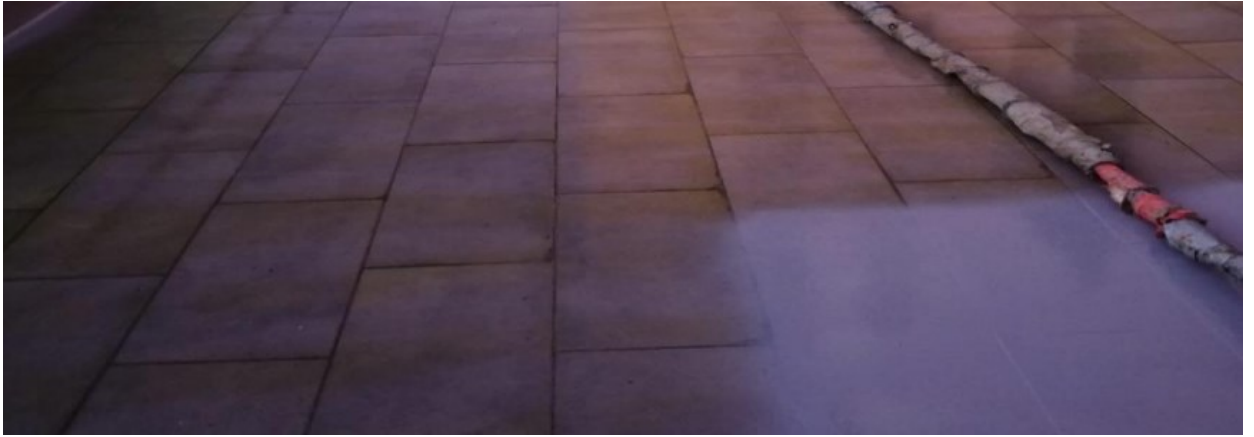

### AY KREř

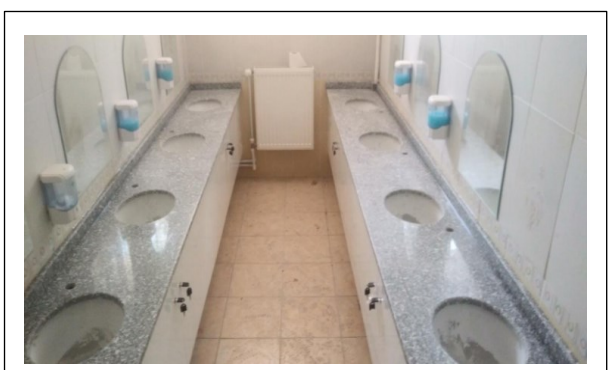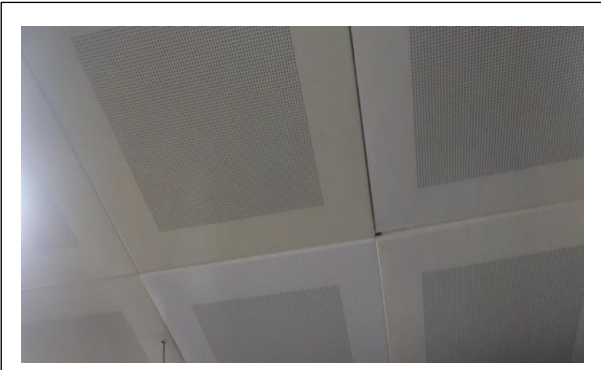

### **TOKİ NİZAMİYE**



### **ECZACILIK FAKÜLTESİ**



### **GÖZLEMEVİ**



## VETERİNERLİK



## ZİRAAT FAKÜLTESİ



## YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU



**HAVACILIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU****ERÜTAM TAVUK ÇİFTLİĞİ****6.1.10 ERÜ. TALAS KONUKEVİ 1 NOLU BİNA İKMAL RESTORASYON UYGULAMA İŞİ**

| <b>TALAS KONUKEVİ 1 NOLU BİNA İKMAL RESTORASYON UYG. İŞİ</b> |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                                                | Kültür                                 |
| <b>Proje No</b>                                              | 2016H04-2695                           |
| <b>Proje Adı</b>                                             | Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu  |
| <b>Proje Yeri</b>                                            | Kayseri-Talas                          |
| <b>Karakteristik</b>                                         | Restorasyon (1.489,00 m <sup>2</sup> ) |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                                    | 2019-2019                              |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>                                  | 796.843,00 TL                          |

Talas Konukevi 1 Nolu Bina İkmal Restorasyon Uygulama işinin İhalesi 2019 yılında yapılmıştır. 16.07.2019 tarihinde iş yeri teslim edilmiş olup 17.12.2019 tarihinde ikmal restorasyon uygulama işi bitirilmiştir.



#### 6.1.11 HASTANELER OG ELEKTRİK TESİSATI YENİLEME VE ONARIM İŞİ

| HASTANELER O.G. ELEKTRİK TESİSATI YENİLEME VE ONARIM İŞİ |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Sektör</b>                                            | Sağlık                           |
| <b>Proje No</b>                                          | 2016I00-2728                     |
| <b>Proje Adı</b>                                         | Muhtelif İşler- Sağlık Onarım    |
| <b>Proje Yeri</b>                                        | Kayseri                          |
| <b>Karakteristik</b>                                     | Sağlık                           |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                                | 2018-2019                        |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>                              | 6.487.000,00 TL (Tasfiye Edildi) |

2017/426453 ihale kayıt nolu ERÜ. Hastaneleri O.G. Elektrik Tesisatı Yenileme ve Onarım İnşaatı Yapım İşİ 07/06/2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4. Maddesine istinaden yüklenicinin fesih talebi Hazine Ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü neticesinde 31.07.2019 tarihinde sözleşme feshedilip, söz konusu iş tasfiye edilmiştir.

**ERÜ HASTANELERİ O.G. ELEKTRİK TEİSATI YENİLEME VE ONARIM İNŞAAT YAPIM İŞİ****6.1.12 ORGAN NAKLİ HASTANESİ ONARIM VE KALP HASTANESİ YANGIN MERDİVENİ YAPIM İŞİ**

| <b>ORGAN NAKLİ HAST. ONARIM VE KALP HAST. YANGIN MERD. İNŞ.</b> |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sektör</b>                                                   | Sağlık                        |
| <b>Proje No</b>                                                 | 2016I00-2728                  |
| <b>Proje Adı</b>                                                | Muhtelif İşler- Sağlık Onarım |
| <b>Proje Yeri</b>                                               | Kayseri                       |
| <b>Karakteristik</b>                                            | Sağlık                        |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                                       | 2017-2019                     |
| <b>Sözleşme Bedeli (TL)</b>                                     | 4.962.813,41.- TL             |

Organ Nakli Hastanesi Onarım ve Kalp Hastanesi Yangın Merdiveni işinin İhalesi 2017 yılında yapılmıştır 04.12.2017 tarihinde iş yeri teslim edilmiş olup, 18.02.2019 tarihinde iş bitirilmiştir.



**6.1.13 SAĞLIK MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI**

| <b>SAĞLIK MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI İŞİ</b> |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                           | Sağlık                                          |
| <b>Proje No</b>                         | 2016I00-2728                                    |
| <b>Proje Adı</b>                        | Muhtelif İşler- Sağlık Makine Teçhizat Alımları |
| <b>Proje Yeri</b>                       | Kayseri                                         |
| <b>Karakteristik</b>                    | Sağlık                                          |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>               | 2019-2019                                       |
| <b>Ödenek Tutarı (TL)</b>               | 10.350.000,00 -TL                               |

2019 Mali Yılı ilgili projemizin Hastane – Makine ve Teçhizat Alımı için ödeneği toplam 10.350.000,00 TL’dir. Bu ödenekten 2.925.000,00 TL (Dış Hekimliği Fakültesi tıbbi cihaz alımları için) düşülmüş olup; Bu projemize Hastane Büyük-Onarım ödeneğinden 5.000.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2019 Mali Yılı içinde toplam 8.758.553,00 TL ve 2.916.314,00 TL harcama olup, kalan ödenek 3.657.821,00 TL’dir.

**ALINAN CİHAZLAR**

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Derin Dondurucu                                                 | 1 adet   |
| EMG Stimülatör/Kayıt Cihazı                                     | 1 adet   |
| Veri Tabanı Sunucuları Yenileme ve Dijital Arşiv Depolama Alanı | 1 adet   |
| Bilgisayar Ekranı/Monitör                                       | 296 adet |
| Masaüstü Bilgisayar/Bilgisayar Kasası                           | 296 adet |
| Alexandrite ve Pulsed Light (Ipl) Lazer Cihazı                  | 1 adet   |
| C-Kollu Seyyar Röntgen Cihazı                                   | 1 adet   |
| Üst Düzey Fako Cihazı                                           | 1 adet   |
| Ventilatör(Transport)                                           | 10 adet  |
| Kan ve Numune Işınlama Cihazı                                   | 1 adet   |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hemodiyaliz Cihazı                         | 4 adet  |
| Gama Prob                                  | 1 adet  |
| Hidrojen Peroksit Gaz Plazma Sterilizatörü | 1 adet  |
| Bibap Cihazı                               | 3 adet  |
| Ventilatör Cihazı                          | 6 adet  |
| Polisomnografi Sistemi Cihazı              | 1 adet  |
| Anguldruva                                 | 40 adet |
| Renkli Yazıcı                              | 1 adet  |
| Aeratör                                    | 60 adet |
| Piyasemen                                  | 45 adet |
| Fotoğraf Makinesi                          | 2 adet  |
| Elektrikli Mikromotor                      | 13 adet |
| Apex Locater                               | 10 adet |
| Led Işıklı Dolgu Cihazı                    | 10 adet |
| Laboratuvar Mikro. ve Piyasemeni           | 2 adet  |
| Diş Ünitisi                                | 15 adet |
| Dinamik Röntgen Cihazı                     |         |

**6.1.14 EĞİTİM MAKİNE TEÇHİZAT VE BİLGİSAYAR ALIM**

| <b>MAKİNE TEÇHİZAT VE BİLGİSAYAR ALIM</b> |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sektör</b>                             | Eğitim                         |
| <b>Proje No</b>                           | 2019H03-3317                   |
| <b>Proje Adı</b>                          | Muhtelif İşler-Makine Teçhizat |
| <b>Proje Yeri</b>                         | Kayseri                        |
| <b>Karakteristik</b>                      | Muhtelif İşler-Makine Teçhizat |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>                 | 2019-2019                      |
| <b>Ödenek Tutarı (TL)</b>                 | 2.000.00,00TL                  |

2019 Mali Yılı ilgili projemizin ödeneği toplam 2.000.000,00 TL'dir. Üniversitemize bağlı birimlerin (fakülte-enstitü-yüksekokul-araştırma merkezleri) makine-teçhizat ihtiyaçları doğrultusunda 2019 Mali Yılı içinde toplam 1.757.760,00 TL harcama olup, kalan ödenek 115.240,00 TL'dir. Harcama oranı % 88 dir.

**6.1.15 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ**

| <b>BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ</b> |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sektör</b>                       | DKH-SOSYAL -<br>TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA   |
| <b>Proje No</b>                     | 2019K12-104777                         |
| <b>Proje Adı</b>                    | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri |
| <b>Proje Yeri</b>                   | Kayseri                                |
| <b>Karakteristik</b>                | Proje Desteği                          |
| <b>Başlama-Bitiş Yılı</b>           | 2019-2019                              |
| <b>Ödenek Tutarı (TL)</b>           | 2.367.00,00-TL                         |

## 6.1.16 KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ AŞISI

| KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ AŞISI GMP LABORATUVARI |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sektör                                           | DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA                |
| Proje No                                         | 2016K12-2842                                     |
| Proje Adı                                        | Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Aşısı-GMP Laboratuvarı |
| Proje Yeri                                       | Kayseri                                          |
| Karakteristik                                    | Makine Teçhizat, Teknolojik Araştırma            |
| Başlama-Bitiş Yılı                               | 2019-2019                                        |
| Ödenek Tutarı (TL)                               | 2.940.00,00-TL                                   |

## 6.1.17 YAYIN ALIM VE BİLGİ ABONELİK GİDERLERİ

| YAYIN ALIM VE BİLGİ ABONELİK GİDERLERİ ALIM İŞİ |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Sektör                                          | EĞİTİM         |
| Proje No                                        | 2019H03-15106  |
| Proje Adı                                       | Yayın Alımı    |
| Proje Yeri                                      | Kayseri        |
| Karakteristik                                   | Proje Desteği  |
| Başlama-Bitiş Yılı                              | 2019-2019      |
| Ödenek Tutarı (TL)                              | 1.500.00,00-TL |

Erciyes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 2019 yılında Ödemesini yaptığı aktif 40 adet elektronik veri tabanı aboneliği bulunmaktadır. Abone olduğumuz elektronik veri tabanları yurt dışından temin edilmekte olup döviz üzerinden alımı yapılmaktadır.

---

**6.1.18 YAZILIM ALIMI**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Yazılım Alımı</b>      |                              |
| <b>Sektör</b>             | EęİTİM                       |
| <b>Proje No</b>           | <b>2019H030590</b>           |
| <b>Proje Adı</b>          | Muhtelif İřler-Yazılım Alımı |
| <b>Proje Yeri</b>         | Kayseri                      |
| <b>Karakteristik</b>      | Proje Desteęi                |
| <b>Başlama-Bitiř Yılı</b> | 2019-2019                    |
| <b>Ödenek Tutarı (TL)</b> | 2.367.00,00-TL               |
